



INTERREG NEXT KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Ankara, 6 Ocak 2026

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

MALİ İŞBİRLİĞİ VE PROJE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığı





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Proje Döngüsü Yönetimi



Proje döngüsü, tanımlamadan sürdürülebilirliğe uzanan sürekli bir süreçtir.

2007-2013 ENI
2014-2020 ENPI
2021-2027 INTERREG NEXT
2028-2035





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Aktivite-Sonuç-Çıktılar
Satın Almalar
Raporlama
Doğrulama
Ödemeler
Sözleşme değişiklikleri
Görünürlük-İletişim
Usulsüzlük

Hibe Sözleşmesi-Ana Yararlanıcı

Finansman Anlaşması

Interreg Tüzüğü





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

HİBE SÖZLEŞMESİ

- 1.Sözleşmenin Amacı ve Genel Hükümler
- 2.Hibe Sözleşmesinin Süresi
- 3.Proje Bütçesi
- 4.Ödemeler ve Harcamaların Geri Ödenmesi
- 5.Bilgi ve Rapor Sunma Yükümlülükleri
- 6.Baş Ortağın Rolü
- 7.Sorumluluk
- 8.Uygun Harcamalar
- 9.Satın Alma Kuralları
- 10.İletişim ve Görünürlük
- 11.Muhasebe Kayıtları ile Teknik ve Mali Kontroller
- 12.Hibenin Nihai Tutarı
- 13.Sürdürülebilirlik, Sonuçların ve Varlıkların Mülkiyeti/Kullanımı
- 14.Projenin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi
- 15.Sözleşmede Değişiklikler
- 16.Sürenin Uzatılması ve Askıya Alma
- 17.Sözleşmenin Feshi
- 18.İdari ve Mali Yaptırımlar
- 19.Geri Alma (Tahsilat)
- 20.Çıkar Çatışması ve İyi Davranış
- 21-Gizlilik
- 22-Kişisel Verilerin Korunması
- 23-Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü
- 24-İletişim Adresleri
- 25-Ekler





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Madde 4- Ödemeler ve harcamaların Geri Ödenmesi

Interreg Co-funded by
the European Union
NEXT Black Sea Basin

PAYMENT TIMELINE



*Example for a regular project with 30 months of implementation period

Avans Ödeme → %30

Ara ödemeler → %50

Nihai ödeme → %20





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Avans Mahsubu (Advance Recovery)

Beyan Edilen Uygun Harcama Tutarı: €10.000

Eş Finansman Kesintisi (%10):

$€10.000 \times \%10 = €1.000$

Eş Finansman Kesintisi Sonrası Tutar:

$€10.000 - €1.000 = €9.000$

Avans Mahsubu Kesintisi (%20):

$€9.000 \times \%20 = €1.800$

Avans Mahsubu Sonrası Ödenecek Tutar:

$€9.000 - €1.800 = €7.200$

Sonuç:

€10.000 tutarındaki beyan edilen uygun harcamadan, eş finansman ve avans mahsup kesintileri uygulandıktan sonra ödenecek **nihai tutar €7.200** olacaktır.





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT

Black Sea Basin

Madde 5-Bilgi ve Rapor Sunma Yükümlülükleri

Ne Zaman?

Raporlama döneminin bitiminden sonra 15 gün içinde

Kim Raporlar?

•Her ortak:

- Kendi faaliyetleri
- Kendi harcamaları

•Lider Ortak (LP):

- Konsolidasyon
- JS'ye sunum

•**Teknik Rapor:** Faaliyetler ve elde edilen çıktılar

•**Mali rapor:** Raporlama döneminde yapılmış ve kontrolöre sunulmadan önce ödenmiş harcamalar

JeMS sistemi üzerinden, destekleyici belgeler eklenerek sunulur.



PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Hibe sözleşmesi madde 5- Ana yararlanıcı ve Ortaklar Sorumluluklar


Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

BİLGİ VE RAPOR SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ - Madde 5

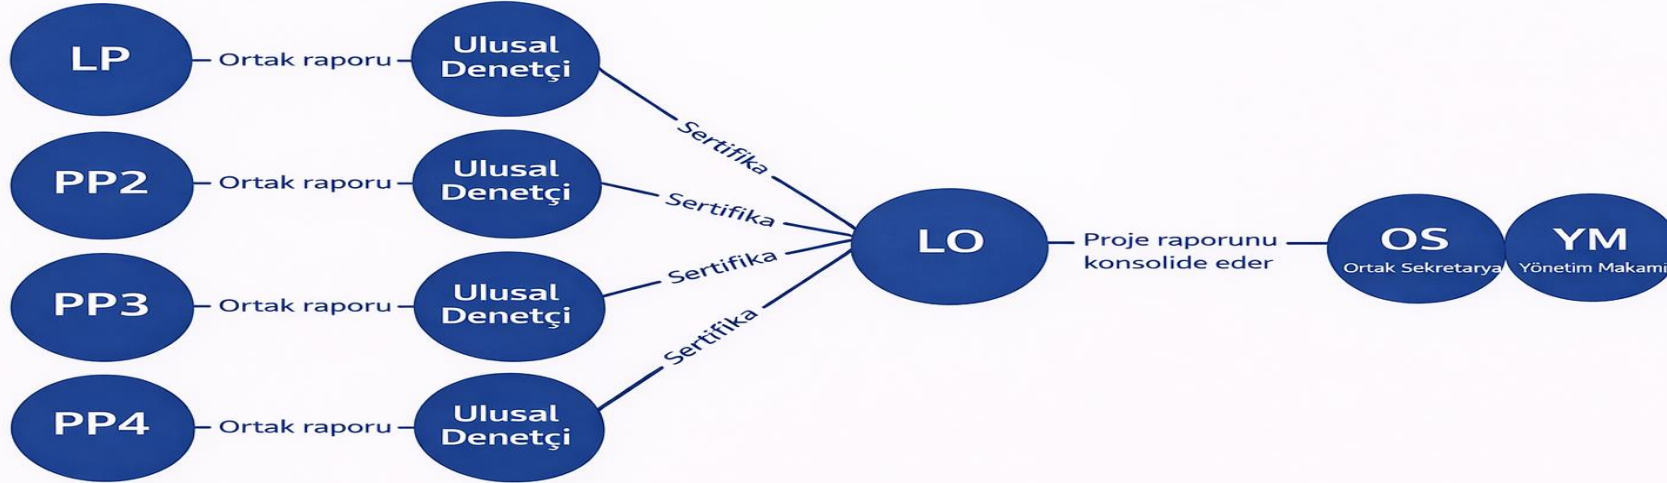



PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

4 Aylık Uygulama



Rapor Hazırlama Süresi
(15 gün tavsiye edilen)



Harcamaların Kontrolü
(yaklaşık 1 ay)

YM Kontrol
süresi(3 ay)



Sonraki ödeme 2 rapor
dönemi sonra





PROJE UYGULAMA ESASLARI



Madde 5.9 Bu maddede belirtilen tutarın %75'inden daha azını doğrulama için sunan ortaklar için bütçede %10'a kadar kesinti uygulanır; Belirtilen tutarın %50'sinden daha azını doğrulama için sunan ortaklar için bütçede %15'e kadar kesinti uygulanır.

Ortak	Toplam Bütçe (€)	15. Aya Kadar Sunulması Gereken Asgari Tutar (€)	Sunulan Tutar (€)	Oran
LP	200.000	100.000	90.000	%90
PP2	120.000	60.000	40.000	%67 ✗
PP3	80.000	40.000	18.000	%45 ✗





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Madde 5.9

Projelerin, harcama hedeflerine kıyasla yetersiz harcama (underspending) durumuna düşmemesi ve bu nedenle Yönetim Otoritesi (MA) tarafından proje bütçesinin azaltılması riskinin ortaya çıkmaması için sağlam bir proje mali yönetimi büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle projelerin:

- Gerçekçi bir harcama planı oluşturması (lot,zamanlama, bütçe)
- Proje onayını takiben, proje uygulamasına çok kısa sürede başlaması;
- Uygulama süreci boyunca mali gerçekleştirmeleri sürekli olarak izlemesi;
- Düzenli, zamanında ve eksiksiz raporlama yapması





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Harcama Kontrolleri

Interreg programındaki ortak ülke, ilgili tüzükte belirtilen ve harcamaların doğrulamalarını yapması için bir kuruluş veya kişiyi "Ulusal Kontrolör" olarak belirleyebilir. Türkiye, bu çerçevede Ulusal Otorite olan Avrupa Birliği Başkanlığı içindeki İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığını "**Ulusal Kontrolör**" olarak belirlemiştir ve bu birim birçok insanı barındıran bir kontrolör havuzu tarafından desteklenmiştir.

Bağımsız kontrolörler: Program düzeyinde belirlenen asgari seçim gerekliliklerine de uygun olarak seçilen profesyonellerden oluşturulan bir veritabanı

Bu program kapsamında bağımsız kontrolörler, proje harcamalarının yasalık ve sisteme uygunluk bakımından kontrolünden sorumludur. Bu kapsamda kontrol tanımı, kontrolörlerin harcamaların uygunluğunu, mal ve hizmetlerin gerçekten sağlandığını ve ulusal ve AB kurallarına uyulduğunu doğrulamak için yaptığı çalışmaları ifade etmektedir.





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Kontrolörlerin görevleri :

- Mal ve hizmetlerin teslim edildiğini ve işlerin yapıldığını doğrulamak;
- Yararlanıcılar tarafından beyan edilen harcamanın uygun döneme ait olduğunu ve ödendiğini doğrulamak;
- Uygunluk kuralları, tedarik ve görünülük gereksinimleri dahil olmak üzere tüm geçerli kurallara uyumunu doğrulamak
- Harcamaların onaylı proje ve imzalanmış finansman anlaşmalarıyla uyumunu doğrulamak;
- Finansal raporun doğruluğunu kontrol etmek;
- Destekleyici belgelerin yeterliliğini ve yeterli bir denetim izinin varlığını doğrulamak;
- Varsa usulsüzlükleri bildirmek.





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

KONTROLÖR NE YAPMAZ

Danışman değildir.
Proje faaliyetlerini yönetmez.
Bütçe veya faaliyetlere önceden onay vermez

https://www.blacksea-cbc.net/images/Methodology_Risk-based_Management_Verifications.pdf

https://www.blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/programme-documents_Guide_for_control_annex_5.1





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Madde 8.8 Uygun Olmayan Harcamalar

Aşağıdaki maliyetler uygun harcama olarak kabul edilmez:

- a) Borçlar ve borçlara ilişkin faizler;
- b) Proje ortakları tarafından beyan edilen ve başka bir proje veya program kapsamında ya da herhangi bir başka kaynaktan finanse edilen maliyetler;
- c) Arazi veya bina satın alımları;
- d) Döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklanan maliyetler;
- e) Üçüncü taraflara verilen krediler;
- f) Hediye niteliğindeki harcamalar;
- g) Para cezaları, mali yaptırımlar ile hukuki uyuşmazlıklar ve dava süreçlerine ilişkin giderler;
- h) Zararlar veya yükümlülükler için ayrılan karşılıklar.





PROJE UYGULAMA ESASLARI



HİBE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK – Madde 15

Bildirimler (Notifications)

- Ortağın adı, irtibat kişisi, yasal temsilcisi veya adresinde yapılan değişiklikler.
- Projenin amaçlarını veya süresini etkilemeyen, banka hesabı güncellemeleri veya küçük ölçekli çalışma planı uyarlamaları.
- Önemli bir etki yaratmayan, ekipman, bütçe kalemleri veya insan kaynaklarına ilişkin değişiklikler (küçük ölçekli projeler için).
- Aynı ana bütçe başlığı içerisindeki kalemler arasında yapılan tutar aktarımları.
- Ana bütçe başlıkları arasında başlangıç tutarının %20'sini aşmayan ve bütçeyi önemli ölçüde etkilemeyen aktarımlar.





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

HİBE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK – Zeyilname -Madde 15

- Proje süresinin uzatılması: Yalnızca uygulama süresinin yarısı tamamlandıktan sonra ve kaçınılmaz gecikmeler olması hâlinde talep edilebilir.
- Ortağın kurumsal yapısında değişiklik yapılması veya bir ortağın değiştirilmesi; yeni kurumun uygunluk kriterlerini sağlaması şartıyla.
- Ana bütçe başlıkları arasında %20'yi aşan aktarımlar; güçlü ve ayrıntılı gerekçe gerektirir.
- Ortaklar arasındaki maliyetlerin yeniden tahsisi; Ortaklık Anlaşması'nın değiştirilmesini gerektirir.
- Çalışma Planında önemli değişiklikler; proje hedeflerine ulaşımın sürdüğünü garanti etmek için detaylı analiz gerektirir.

☞ Bu değişiklikler ZEYİLNAME (addendum) gerektirir ve Yönetim Makamından önceden onay alınmadan uygulanamaz.





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Usulsüzlük : Avrupa Birliği hukukunun, ulusal mevzuatın veya sözleşme hükümlerinin bir ihlali sonucunda, AB bütçesinin zarar görmesine veya zarar görme riskine yol açan her türlü eylem veya ihmali ifade eder. Kasıtlı veya kasıtsız olabilir. Mali etki doğurmuş ya da doğurma potansiyeline sahip olması yeterlidir.

Regulation 2988/1995
on the protection of
the EU's financial
interest

Regulation 2185/1996
concerning on-the-
spot checks and
inspections

Regulation 2024/2509
Financial Regulation

Regulation 883/2013
concerning OLAF

Regulation 1939/2017
on European Public
Prosecutor's Office
(EPPO)

Directive 1372/2017
on fight against fraud

Directive 2019/1937
on the protection of
the persons who
report





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Usulsüzlük Örnekler

- *Alımların Bölünmesi: Bir satın almanın, ihale veya rekabetçi prosedürden kaçınmak amacıyla bilinçli olarak daha küçük tutarlara bölünmesi durumudur. Örneğin, tek seferde yapılması gereken €9.800'luk bir alımın, €4.900 + €4.900 şeklinde iki ayrı satın alma gibi gösterilmesi.*
- *Zaman Çizelgeleri :Personelin, gerçekte çalışmadığı saatleri çalışmış gibi göstermesi veya aynı çalışma süresini birden fazla projede raporlamasıdır.*
- *İhaleye giren firmalar/komite üyeleri arasında çıkar ilişkileri*
- *Gerçek bir mal veya hizmet sunumu olmaksızın düzenlenen ya da bedeli/içeriği gerçeği yansıtmayan faturaların raporlanmasıdır.*





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Article 4 of Regulation 2988/1995

“Genel kural olarak, her türlü usulsüzlük haksız şekilde elde edilen avantajın geri alınmasını (...) ve ödenmesi gereken veya yanlış şekilde alınmış tutarın iadesini gerektirir.(...)”

Tedbirin uygulanması, haksız avantajın geri alınmasıyla sınırlıdır; gerekiyorsa, götürü usulde belirlenebilecek faiz de eklenebilir.”





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Article 5 of Regulation 2988/1995

- a) İdari para cezası ödenmesi*
- b) Yanlış alınan veya kaçınılan tutardan daha yüksek bir tutarın ve uygun olduğu durumda faizin ödenmesi*
- c) Sağlanan fonun tamamen veya kısmen geri alınması*
- d) Usulsüzlüğün gerçekleştiği dönemden sonraki dönem için avantajdan men edilme / avantajın geri çekilmesi*
- e) Bir Topluluk yardım programına katılım için gerekli onay veya tanınırlığın geçici olarak geri alınması*
- f) “[...] bir mali aktörün veya başka bir kişinin görevlerini tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getirmesinin; ailevi, duygusal, siyasi ya da ulusal yakınlık, ekonomik çıkar ya da diğer doğrudan / dolaylı kişisel çıkar nedeniyle tehlikeye düşmesi çıkar çatışmasıdır.”*





PROJE UYGULAMA ESASLARI

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin



Project toolkit



Fiches

Access now



Comm & Visibility

Access now



Instructions

Access now



Jems

Access now



Connect with us



facebook.com/BlackSeaBasin



instagram.com/blackseabasin



x.com/BlackSeaBasin



linkedin.com/company/interregnextblackseabasin



blacksea-cbc.net





Bilgi Kaynakları

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Black Sea Basin

Aşağıdaki adreslerinden güncel duyurulara ulaşılabilir.

- Program Resmi İnternet Sitesi: <http://blacksea-cbc.net/>
- Başkanlığımız İnternet Sitesi: <http://www.ab.gov.tr/>
- Başkanlığımız Sınır Ötesi İşbirliği İnternet Sitesi: <http://cbc.ab.gov.tr/>

